
## **REPORTE PERT-CPM - CONTROL DE OBRAS**

Proyecto: Construcción de Vivienda de Dos Plantas + Azotea Ubicación: Chiclayo, Lambayeque | Empresa: CONSORCIO DEJ

## 1. Diagrama de Red PERT-CPM

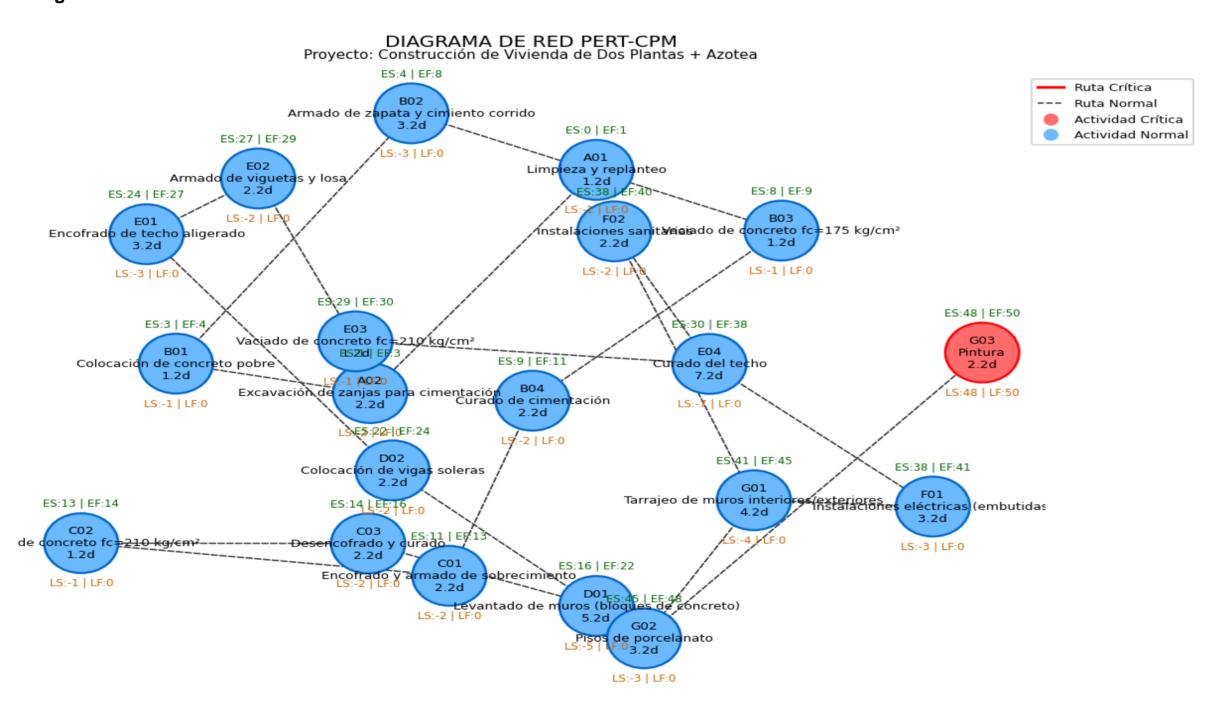

## 2. Diagrama de Gantt

Cronograma de Ejecución

G03: Pintura

Especialidad

porcelanato

es/exteriores

Estructuras

Instalaciones

Cádigo	Actividad	Duración Espera <b>da</b> timista		Más Probab <b>R</b> esimista		Varianza	Especialidad
Código	Actividad						Especialidad
A01	Limpieza y replanteo	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
A02	Excavación de zanjas para cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
B01	Colocación de concreto pobre	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
B02	Armado de zapata y cimiento corrido	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
B03	Vaciado de concreto fc=175 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
B04	Curado de cimentación	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
C01	Encofrado y armado de sobrecimiento	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
C02	Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
C03	Desencofrado y curado	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
D01	Levantado de muros (bloques de concreto)	5.17	5.0	5.0	6.0	0.03	Estructuras
D02	Colocación de vigas soleras	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
E01	Encofrado de techo aligerado	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Estructuras
E02	Armado de viguetas y losa	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Estructuras
E03	Vaciado de concreto fc=210 kg/cm²	1.17	1.0	1.0	2.0	0.03	Estructuras
E04	Curado del techo	7.17	7.0	7.0	8.0	0.03	Estructuras
F01	Instalaciones eléctricas (embutidas)	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Instalaciones
F02	Instalaciones sanitarias	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Instalaciones
G01	Tarrajeo de muros interiores/exteriores	4.17	4.0	4.0	5.0	0.03	Acabados
G02	Pisos de porcelanato	3.17	3.0	3.0	4.0	0.03	Acabados
G03	Pintura	2.17	2.0	2.0	3.0	0.03	Acabados
